

## REPORTE DE OBRA

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS TINAJAS. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LOCALIZACIÓN: <b>TEOCALTICHE</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INICIO DE PROYECTO: 09/02/2022                      | TERMINO DE PROYECTO: <u>OBRA EN PROCESO</u>                                                                                                                                                                                                                             |
| ENCARGADO DE PENSIÓN: <b>C. Daniel Santos Serna</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PERSONAL ASIGNADO:                                  | <i>JOSE RODRIGUEZ REYES-LUIS ALBERTO SIGALA GONZALEZ-JOSE LUIS DURAN MARTINEZ-JAVIER MARTINEZ ALFEREZ-CRISTOBAL ROSAS IÑIGUEZ-VALENTIN CERVANTES ELIZALDE-RAUDEL SALZAR VIDAURRI-HECTOR ORTIZ VILLALOBOS-JUAN JOSE GONZALEZ QIJAS-JAIME ALEJANDRO CASILAS GUERRERO.</i> |
| ACTIVIDAD:                                          | <i>SE COMENZO A RETIRAR ESCOMBRO, Y SE RELLENO CON TEPETATE, Y SE EMPAREJO CON RETRO, SE REALIZO MURO PARA INSTALACION DE BANQUETA, Y SE ENJARRO BARDA QUE CONECTA CON CALLE HIDALGO,</i>                                                                               |









## REPORTE DE OBRA


|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: EMPEDRADO ENC ALLE CEDROS                 |                                                                   |
| LOCALIZACIÓN: <b>TEOCALTICHE</b>                    |                                                                   |
| INICIO DE PROYECTO: 07/02/2022                      | TERMINO DE PROYECTO: 17/02/2023                                   |
| ENCARGADO DE PENSIÓN: <b>C. Daniel Santos Serna</b> |                                                                   |
| PERSONAL ASIGNADO:                                  | <b>LUIS ALBERTO DIAZ RAMIREZ-DANIEL GOMEZ MORA-JESUS NAVARRO</b>  |
| ACTIVIDAD:                                          | <b>TEPETATE COMPACTADO Y RELLENO CON PIEDRA DE BOLA O DE RIO.</b> |





## REPORTE DE OBRA

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: EMPEDRADO EN CALLEJON DE LA UNIDAD        |                                                            |
| LOCALIZACIÓN: <b>TEOCALTICHE</b>                    |                                                            |
| INICIO DE PROYECTO: 07/02/2022                      | TERMINO DE PROYECTO: 17/02/2023                            |
| ENCARGADO DE PENSIÓN: <b>C. Daniel Santos Serna</b> |                                                            |
| PERSONAL ASIGNADO:                                  | LUIS ALBERTO DIAZ RAMIREZ-DANIEL GOMEZ MORA-JESUS NAVARRO  |
| ACTIVIDAD:                                          | TEPETATE COMPACTADO Y RELLENO CON PIEDRA DE BOLA O DE RIO. |

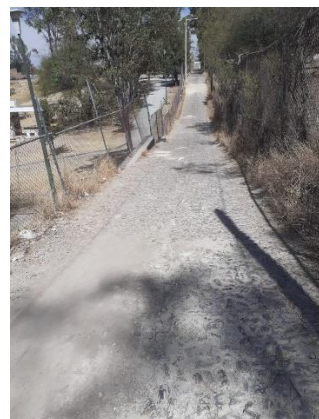



## REPORTE DE OBRA

PROYECTO: INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUSTO SIERRA

LOCALIZACIÓN: **TEOCALTICHE**

INICIO DE PROYECTO: 28/11/2022

TERMINO DE PROYECTO: **OBRA EN PROCESO**

ENCARGADO DE PENSIÓN: **C. Daniel Santos Serna**

PERSONAL ASIGNADO: FLORENCIO CADENA MENDOZA-JUAN ANTONIO VELAZCO CHAVEZ-ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ-JUAN JOSE RODRIGUEZ PEREZ-EZEQUIEL VILLALOBOS ACOSTA-GREGORIO ANTONIO LUNA LOPEZ-JOSE ALBERTO JUAREZ ALBARADO-RICARDO ALONSO PUGA-ANGEL EMMANUEL ESTRADA JAUREGUI-DIEGO ISLAM VARGAS DURAN.


ACTIVIDAD: SE TRABAJO CON RETRO ESCABADORA PARA SONDEAR LOS TUBOS DE AGUA POTABLE, SE COMENZO CON LA CONSTRUCCION DE LOS REGISTROS DE AGUA POTABLE Y SE INSTALARON LAS VALBULAS, SE AGILIZO EL TRABAJO CON 2 RETRO ESCABADORAS PARA LAS TOMAS HACIA CADA FINCA DE LA CALLE. SE INSTALARON 4 TOMAS PREVENTIVAS SE INSTALARON LINEA DE DRENAJE SANITARIO A CADA PROPIEDAD, SE COMENZO A TRABAJAR CON MOTOCONFORMADORA PARA MEZCLAR BASE Y SUB BASE PARA EMPAREJAR LA CALLE JUSTO SIERRA PARTE 1 SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA CADA FINCA SE COLO LA RAMPA Y SE RELLENO CAJON DE LA MISMA, Y EN JUSTO SIERRA ESQUINA CON DIAZ ORDAZ SE METIO REFUERZO DE CIMIENTO A CADA PROPIEDAD, Y SE COLO PARA EL REFUERZO DE LA MISMA. Y EN PARTE 2 DE CALLE JUSTO SIERRA SE TRABAJO CON MOTOCONFORMADORA PARA MEZCLAR BASE Y SUB BASE PARA QUEDAR EMPAREJADA LA CALLE Y DAR CONTINUIDAD CON EL CEMENTO HIDRAULICO DE IGUAL MANERA SE INSTALO LA TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO PARA CADA PROPIEDAD, SE INSTALARON VALBULAS, SE HICIERON TOMAS PREVENTIVAS DE DRENAJE EN LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE DANDO UN TOTAL DE 4 TOMAS, Y EN SERVICIO 20 TOMAS, Y DE AGUA SE INSTALARON 2 TOMAS PREVENTIVAS Y DE SERVICIO 22 TOMAS, EN LA SEGUNDA ETAPA SE REALIZARON 13 TOMAS DE DRENAJE POR SERVICIO Y 13 TOMAS DE AGUA EN SERVICIO, SE HIZO BASE Y SUB BASE PARA EMPAREJAR LA

*CALLE SE RELIZARON MACHUELOS Y SE RELLENO CON TEPETATE, Y SE COMPACTO CON BAILARINA Y SE HICIERON RAMPAS CON SU ENJARRE PARA CADA PROPIEDAD, SE COLARON Y SE HICIERON PLANTILLAS, SE RELIZO CIMIENTO DE REFUERZO EN LA ESQUINA JUSTO SIERRA Y DIAZ ORDAS AMBOS LADOS Y SE CONTINUA CON EL ENJARRE.*







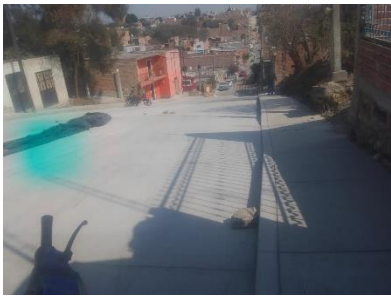



## REPORTE DE OBRA

PROYECTO: INSTALACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA  
DELEGACION MECOACANEJO

LOCALIZACIÓN: **TEOCALTICHE**

INICIO DE PROYECTO: 14/12/2022


TERMINO DE PROYECTO: **OBRA EN PROCESO**


ENCARGADO DE PENSIÓN: **C. Daniel Santos Serna**

PERSONAL ASIGNADO: SAUL LOPEZ ALVARADO-ARMANDO ESPINOZA JAUREGUI-JORGE  
ESCOBAR RODRIGUEZ-BRAYAN JESUS CRUZ SANTIAGO-RUBEN  
VAZQUEZ HERNANDEZ-


ACTIVIDAD: SE COMENZO TRABAJANDO CON LA RETROESCABADORA TUMBANDO PALMAS Y LEVANTANDO UNA PARTE DE LA BANQUETA,SE HIZO SANJA Y SE COMENZO CON EL POZO DE VISITA # 1 SE COMENZO CON PLANTILLA DE REGISTRO I-2 Y 3 Y SE REALIZO EL POZO # 2 SE INSTALO LA TUBERIA PARA EL POZO # 1 Y SE TERMINO DICHO POZO CON TODO Y REGISTRO, POSTERIORMENTE SE INSTALARON LOS TUBOS PARA EL REGISTRO 2 Y SE TERMINO ASI COMO EL REGISTRO 3 – SE ENJARRARON TODOS LOS REGISTROS Y SE ENMACILLARON LOS 3 REGISTROS Y SE CONTINUO CON TUBOS DE REGISTROS-POSTERIORMENTE SE CONTINUO CON LA HECHURA DE LA PLANTILLA DEL POZO 4-5 Y 6 Y SE CONTINUO CON LA TUBERIA SE INSTALARON LOS TUBOS PARA LOS POZOS SE ENJARRARON Y ENMACILLARON POZO 4-5 Y 6 SE COMENZO CON EL SONDEO PARA LA LINEA PREVENTIVA DE DRENAJE,SE RELLENO EL POZO DE VISITA Y SE LES PUSO BROCALES Y MEJORALES A TODOS LOS POZOS, SE COMPACTO LA SANJA CON BAILARINA Y SE RELLENO CON RETRO Y SE ATERRO LA SANJA CON RETROEXCABADORA DE LA LINEA PRINCIPAL SE ABRIERON 11 TOMAS PREVENTIVAS, SE COMENZO A ABRIR LA CALLE DENOMINADA LA CURVA Y SE CONTINUO CON LOS REGISTROS, SE CONTINUO TRABAJANDO CON ESCABADORA PARA LA LINEA DE DRENAJE, SE INSTALO LA TUBERIA,SE ATERRO SANJA Y SE REALIZARON PLANTILLAS PARA POZO DE VISITA,Y SE TERMINARON. SE CONTINUA CON ESCABADORA EN CALLE RAMON CORONA, SE ESCABO CON RETRO ESCABADORA Y CONSTRULLENDO POZOS DE VISITA PARA LA ISNTALACION DE TUBERIA,Y SE ATERRO

*SANJA CON RETRO, Y SE CONTINUA CON LA REALIZACION DE PLANTILLAS PARA LOS MISMOS, ENJARRANDO Y ENMACILLANDO POZOS.*



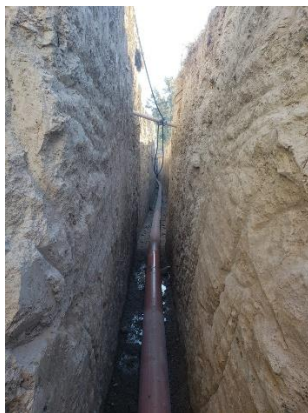



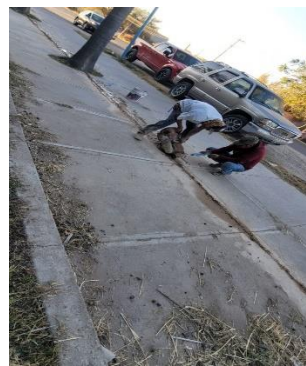

## REPORTE DE OBRA

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PINO SUAREZ |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LOCALIZACIÓN: <b>TEOCALTICHE</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INICIO DE PROYECTO: 16/02/2022                           | TERMINO DE PROYECTO: <u>OBRA EN PROCESO</u>                                                                                                                                                                                                      |
| ENCARGADO DE PENSIÓN: <b>C. Daniel Santos Serna</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PERSONAL ASIGNADO:                                       | <i>RUBEN VAZQUEZ HERNANDEZ-FAUSTINO SALDIVAR MORA-J.<br/>         JESUS SCRUIZ GUERRERO-JOSE FIDEL VIVAS CADENA-SERGIO JAVIER<br/>         RODRIGUEZ PUGA-JORGE ESCOBAR RODRIGUEZ-EFRAIN LUEVANOS<br/>         AVILA-ISMAEL VILLEGAS MACIAS-</i> |
| ACTIVIDAD:                                               | <i>SE REALIZO LA ROTURA PARA SANJA, SE LEVANTO TUBO ANTERIOR<br/>         PARA INSTALAR TUBO NUEVO,</i>                                                                                                                                          |





## REPORTE DE OBRA

|                                                                        |                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| PROYECTO: REHABILITACION EN CEMENTERIO MUNICIPAL.                      |                                             |
| LOCALIZACIÓN: <b>TEOCALTICHE</b>                                       |                                             |
| INICIO DE PROYECTO: 09/02/2022                                         | TERMINO DE PROYECTO: <u>OBRA EN PROCESO</u> |
| ENCARGADO DE PENSIÓN: <b>C. Daniel Santos Serna</b>                    |                                             |
| PERSONAL ASIGNADO: JOSE LUIS MARIN GARCIA-JUAN MANUEL ARGUELLES GARCIA |                                             |
| ACTIVIDAD: SE INSTALO LOZA DE CANTERA EN PISO.<br>-                    |                                             |





## REPORTE DE OBRA

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: REHABILITACION Y REMODELACION EN COMANDANCIA MUNCIIPAL. |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LOCALIZACIÓN: <b>TEOCALTICHE</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INICIO DE PROYECTO: 07/02/2022                                    | TERMINO DE PROYECTO: <u>OBRA EN PROCESO</u>                                                                                                                                                                                                                    |
| ENCARGADO DE PENSIÓN: <b>C. Daniel Santos Serna</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERSONAL ASIGNADO:                                                | <i>SIMON CRUZ AVILA-JAIME ALVARADO ROSAS-MIGUEL ANGEL<br/>           AGUAYO CRUZ-JUAN FERNANDO VILLALOBOS VILLALOBOS-JUAN<br/>           MANUEL CARRILLO CALVILLO-ARMANDO CRUZ-GARACIA-<br/>           FLORENCIO CADENA MENDOZA-JUAN LUIS SANCHEZ FUENTES.</i> |
| ACTIVIDAD:                                                        | <i>REMODELACION DE LAS ANTERIORES CELDAS A HABITACIONES<br/>           PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN TURNO, ASI COMO<br/>           MANTENIMIENTO DE BARDAS, BAÑOS Y PISOS.</i>                                                                       |







## REPORTE DE OBRA

|                                                     |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS               |                                                                                                                                                                                |
| LOCALIZACIÓN: <b>TEOCALTICHE</b>                    |                                                                                                                                                                                |
| INICIO DE PROYECTO: 16/02/2022                      | TERMINO DE PROYECTO: <u>OBRA EN PROCESO</u>                                                                                                                                    |
| ENCARGADO DE PENSIÓN: <b>C. Daniel Santos Serna</b> |                                                                                                                                                                                |
| PERSONAL ASIGNADO:                                  | <i>RUBEN RAMOS RUVALCABA-ABEL PUGA SERNA-ARMANDO LOPEZ<br/>           MARTINEZ-JUAN JOSE RODRIGUEZ PEREZ-JUAN JOSE GONZALEZ<br/>           QUIJAS-ALEJANDRO ESPARZA DURAN.</i> |
| ACTIVIDAD:                                          | <i>CONSTRUCCION DE BARDAS A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT-<br/>           BOOL DE 2.60 DE ALTURA Y 2.50 DE ANCHO.</i>                                                         |



